

„PRONAD-Q”

PROJEKTY I NADZORY Jarosław Kubis

ul.Powstańców 77, 43 – 211 Czarków

NIP: 638-122-59-10; REGON: 273191103

tel.:0 791 75 12 20;e-mail: kubis.n@gmail.com

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS PROWADZONYCH ROBÓT

Inwestycja: Budowa sieci kanalizacji deszczowej i remont nawierzchni w ciągu ulic: Jeziorskiej i Zawadzkiej w Orzeszu - Zazdrości

Inwestor: **Miasto Orzesze**

43 – 180 Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca 21

Opracował: mgr inż. Jarosław Kubis

nr WK.....7221, 7A-2016
z dnia.....18.05.2016 r.

~~mgr inż. Jarosław Wójcik~~

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
43-170 ŁAZISNA GÓRNE
ul. Chopina 8
tel./fax. (32) 224-44-99

Orzesze, maj 2016r.

Załącznik do: WNIOSK O MA
 Nr: 00.0002.53 01
 z dnia: 08.06.19

PROJEKT ZAWIERA

Część opisowa

1. Opis techniczny

Część graficzna

1. Plan orientacyjny - rys. nr 1
2. Plan sytuacyjny w skali 1:1000 – oznakowanie istniejące - rys. nr 2 - 9
3. Plan sytuacyjny w skali 1:1000 – oznakowanie na czas robót ETAP 1 - rys. nr 10
Oznakowanie na czas robót – obszar robót
4. Plan sytuacyjny w skali 1:2000 – oznakowanie na czas robót ETAP 1
- wyznaczenie objazdów - rys. nr 11- 12
5. Plan sytuacyjny w skali 1:1000 – oznakowanie na czas robót ETAP 2 - rys. nr 13
Oznakowanie na czas robót – obszar robót
6. Plan sytuacyjny w skali 1:2000 – oznakowanie na czas robót ETAP 2
- wyznaczenie objazdów - rys. nr 14

URZĄD MIEJSKI ORZESZE
WYDZIAŁ KOMUNALNY
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
woj. śląskie
Załącznik do pisma

nr WK. 7221.17.2016

z dnia 18.05.2016

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
43-170 ŁAZISKA GÓRNE
ul. Chopina 8
tel./fax (022) 224-44-99

OPIS TECHNICZNY

URZĄD MIEJSKI ORZESZE
WYDZIAŁ KOMUNALNY
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
woj. śląskie
Załącznik do pisma

nr WK...721 17 2d6

z dnia...18.05.2016

POCZTA POLSKA
43-170 ŁAZISKA GÓRNE
ul. Chopina 6
tel. 71 73 10 10 11

1. Podstawa opracowania.....	3
2. Inwestor.....	3
3. Cel i zakres opracowania.....	3
4. Stan istniejący – charakterystyka	4
5. Projektowane rozwiązanie – projekt tymczasowej organizacji ruchu.....	4
5.1. Zasady ogólne	4
5.2. Oznakowanie robót.....	4 - 5
5.3. Obowiązki wykonawcy.....	5
6. Termin wykonania robót.....	5
7. Uwagi.....	5

URZĄD MIEJSKI ORZESZE
WYDZIAŁ KOMUNALNY
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
woj. śląskie
Załącznik do pisma

nr WK. 224.17.2016

z dnia 18.05.2016

POWIAZOWY ZARZĄD DRÓG
43-170 ŁAZIEKA GÓRNE
ul. Chopina 8
tel./fax. (32) 224-14-00

1. Podstawa opracowania.

Podstawą opracowania są:

- zlecenie Miasta Orzesze ul. Św. Wawrzyńca (Umowa nr WK 5/2016 z dnia 03.03.2016r.)
- plan sytuacyjny w skali 1:1000
- wizja w terenie
- przepisy obowiązujące w powyższym zakresie :
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem
- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

2. Inwestor:

Miasto Orzesze

ul. Św. Wawrzyńca 21

43 – 180 Orzesze

3. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest zaprojektowanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robót drogowych związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej i remontem nawierzchni w ciągu ulic: Jeziorskiej i Zawadzkiej w Orzeszu – **Zazdrości**.

URZĄD MIEJSKI ORZESZE
ZAKŁAD GOSPODARSTWA KOMUNALNEGO
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
woj. śląskie
Załącznik do pisma
nr WK. 7221.17.2016
z dnia 18.05.2016

Projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robót

ul. Jeziorska i ul. Zawadzka

43-170 ŁĄTYSKA GÓRNE
ul. Chopina 8
tel./fax. (32) 284-44-03

4. Stan istniejący – charakterystyka ruchowa.

Ulica Jeziorska i ul. Zawadzka są drogami gminnymi o nawierzchni asfaltowej o szerokości 5,70 - 6,00m. Natężenie ruchu na ww. drogach jest średnie i stanowi głównie dojazd do budynków zlokalizowanych przy ww. ulicach.

Istniejące oznakowanie w ciągu ww. ulic przedstawiono na planie sytuacyjnym – rys. 2-9.

5. Projektowane rozwiązanie – projekt tymczasowej organizacji ruchu

5.1. Zasady ogólne

Oznakowanie pionowe robót prowadzonych w ciągu ul. Jeziorskiej i ul. Zawadzkiej należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2003r. W sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. W sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Zabezpieczenie i oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym powinno być dostosowane do utrudnień na drodze oraz zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom ruchu drogowego oraz osobom wykonującym roboty. Oznakowanie powinno być dobrze widoczne w dzień i w nocy oraz utrzymywane w należyтым stanie przez cały okres trwania robót.

5.2. Oznakowanie robót.

Zaplanowano przebudowę odcinka drogi ul. Jeziorskiej o długości 274,00m z obustronnym krawężnikiem. Roboty będą prowadzone w pasie drogowym o szerokości 6,30 – 8,00m. W jezdni ul. Jeziorskiej zaplanowano budowę sieci kanalizacji deszczowej – rurociąg z rur PVC lub PP SN 8 o średnicy fi 300mm o długości 235mb.

W ciągu ul. Zawadzkiej zaplanowano rurociąg z rur PVC lub PP SN8 o średnicy fi 400mm i długości 67mb.

Roboty podzielono na 2 etapy. Ze względu na rodzaj robót (budowa kanalizacji deszczowej w osi jezdni) zaplanowano całkowite zamknięcie drogi z wyznaczeniem objazdów.

I etap (od budynku nr 3b do skrzyżowania z ul. Zawadzką ze skrzyżowaniem z ul. Kościelną).

Oznakowanie i zabezpieczenie robót przedstawiono na rys. 10. Wyznaczone objazdy dróg przedstawiono na mapach w skali 1: 2000 – rys. 11 i rys. 12.

II etap (od skrzyżowania z ul. Zawadzką do budynku nr 16).

Oznakowanie i zabezpieczenie robót przedstawiono na rys. 13. Wyznaczone objazdy dróg przedstawiono na mapach w skali 1: 2000 – rys. 14.

5.3. Wykonawca robót jest zobowiązany do:

- 1) Poinformowania mieszkańców (7 dni przed) o terminie wprowadzenia ograniczeń w ruchu drogowym związanych z prowadzonymi robotami oraz o planowanym terminie ich zakończenia
- 2) Oznakowania i zabezpieczenia robót.
- 3) Natychmiastowego usunięcia uszkodzenia lub uzupełnienia jakiegokolwiek elementu oznakowania w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia tego elementu. Obowiązek kontroli oznakowania robót należy do kierownika robót.
- 4) Przygotowania kładek dla pieszych U-28 w celu umożliwienia przejścia pieszych (mieszkańców) na posesje.
- 5) Umożliwienia w razie konieczności dojazdu samochodom uprzywilejowanym.
- 6) Usunięcia oznakowania wprowadzonego na czas robót po ich zakończeniu.


6. Termin wykonania robót: 2016r.

7. Uwagi

Oznakowanie na czas prowadzonych robót należy wykonać ze znaków z grupy „średnie” wykonanych z folii odblaskowej.

URZĄD MIEJSKI ORZESZE
WYDZIAŁ KOMUNALNY
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
woj. śląskie
Załącznik do pisma
nr WK. 7221.14.2016
z dnia 18.05.2016

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
43-170 LATISKA GÓRNE
ul. Chopina 8
tel./fax. (32) 224-44-00

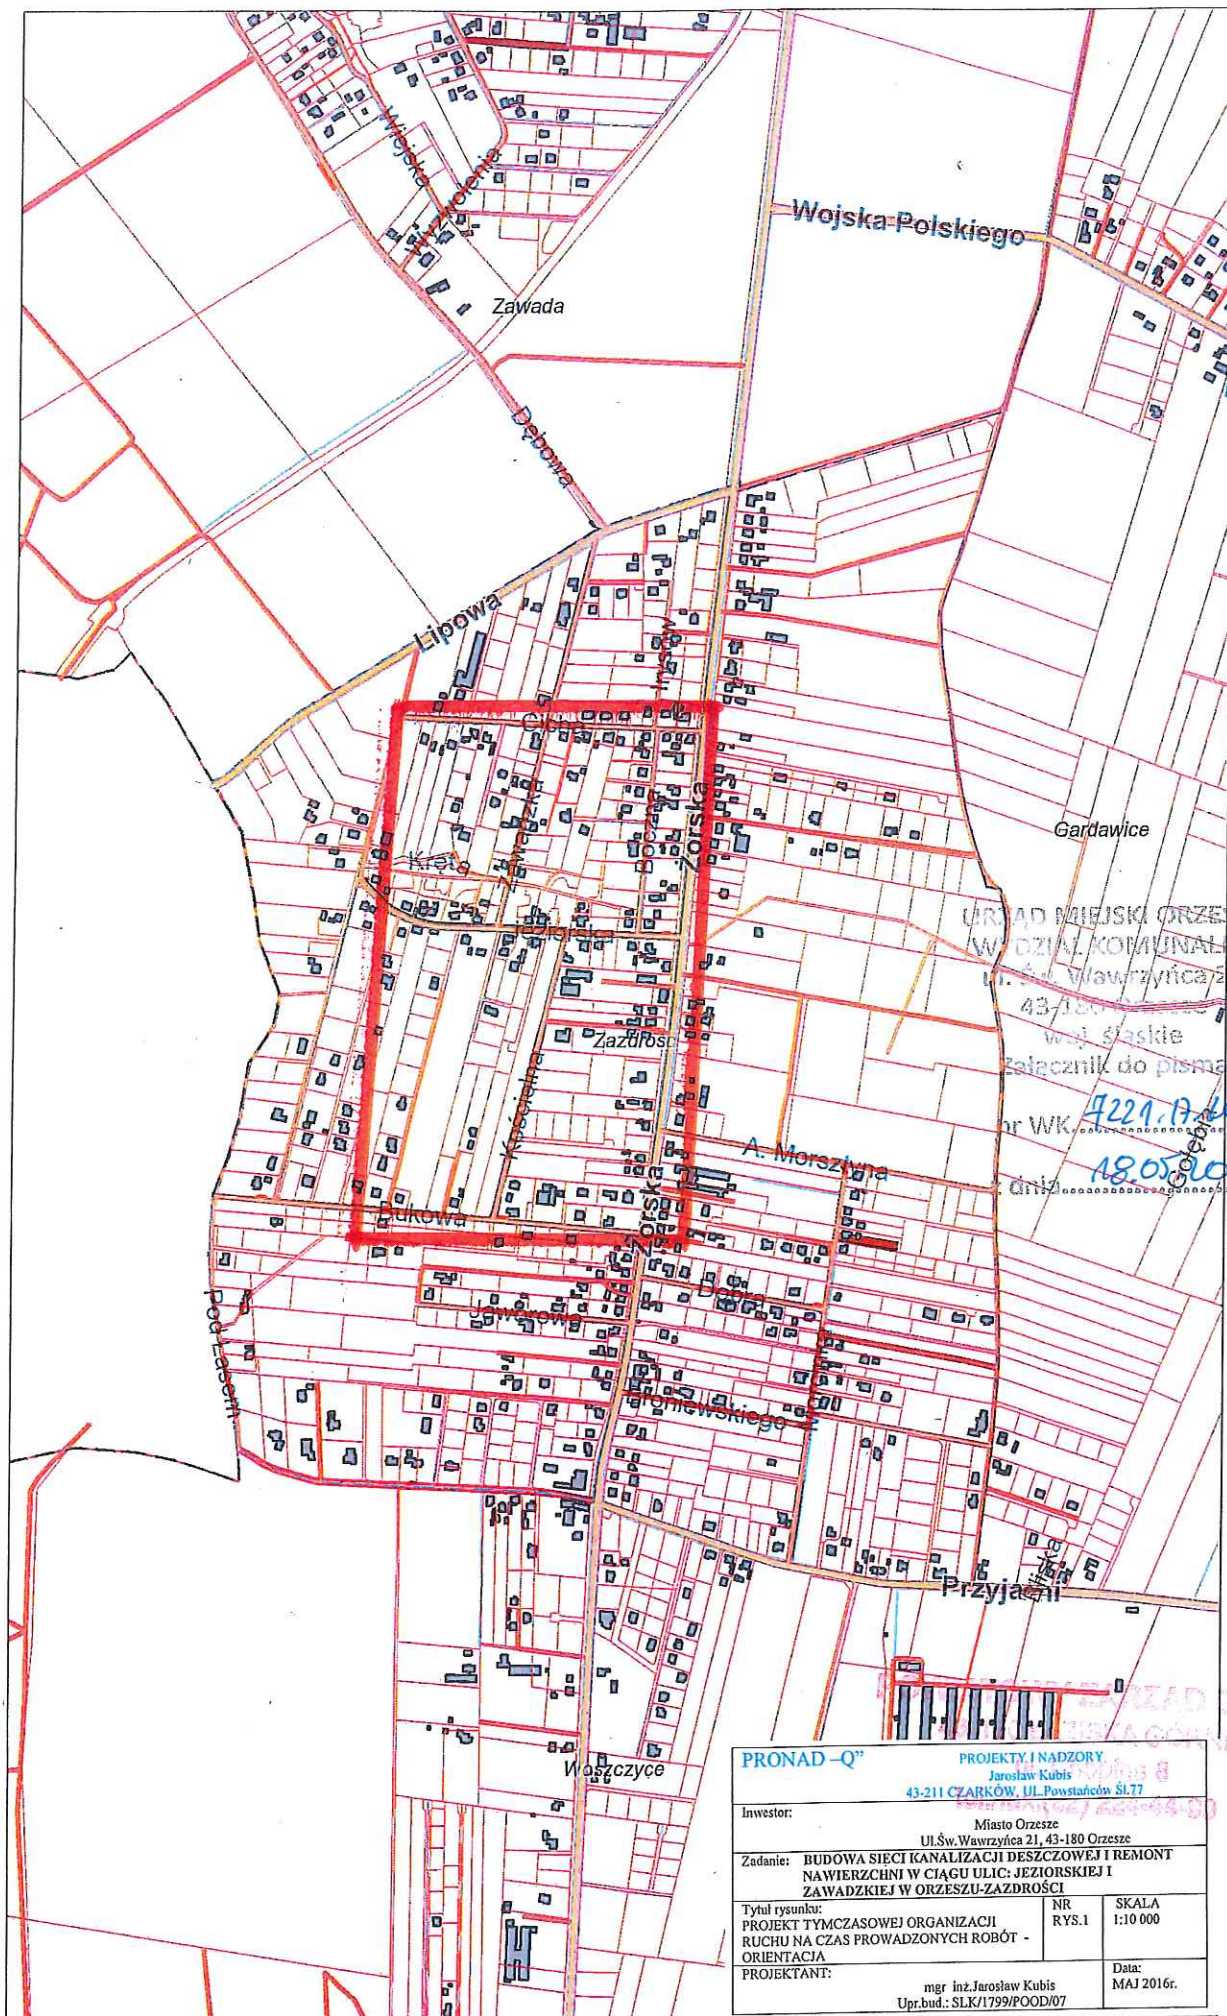

URZĄD MIEJSKI ORZESZE
WYDZIAŁ KOMUNALNY
ul. Św. Wawrzyńca 21

43-100 Orzesze

woj. śląskie
załącznik do pisma

nr WK 4229.74.016

dnia 18.05.2016

PRONAD-Q"

PROJEKTY I NADZORY

Jarosław Kubis
43-211 CZARKÓW, UL. Powstańców ŚL.77

Investor:

Miasto Orzesze
ul. Św. Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze

Zadanie: BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ I REMONT
NAWIERZCHNI W CIĄGU ULIC: JEZIORSKIEJ I
ZAWADZKIEJ W ORZESZU-ZAZDROŚCI

Tytuł rysunku:
PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI
RUCHU NA CZAS PROWADZONYCH ROBÓT -
ORIENTACJA
PROJEKTANT:

NR
RYS.1

SKALA
1:10 000

mgr inż. Jarosław Kubis
Upr.bud.: SLK/1799/POOD/07

Data:
MAJ 2016r.
